



ÖXARFJÖRÐUR Í SÓKN

Lokaskýrsla
Brothættar byggðir

Öxarfjörður í sókn - Lokaskýrsla

Efnisyfirlit

Hugleiðingar og samantekt verkefnisstjóra

Markmið og tilgangur verkefnisins Brothættra byggða

Stjórn verkefnisins

Undirbúningur, stefnumótun, áætlanagerð, framkvæmd og lok verkefnisins.

Meginniðurstöður

Staða starfsmarkmiða ÖÍS

Staða styrktra verkefna

Mynd á forsíðu: Charlotta Englund, aðrar myndir tók Kristján Þ. Halldórsson

Hugleiðingar og samantekt verkefnisstjóra

Pátttöku Byggðastofnunar í verkefni Brothættra byggða í Öxarfjarðarhéraði lauk formlega um áramótin 2020/21 eftir fimm ára samstarf, eða frá ársbyrjun 2016. Samkvæmt samningi átti verkefninu að ljúka í lok árs 2019 en það var framlengt um eitt ár. Verkefnisstjórn Öxarfjarðar í sókn mun á árinu 2021 standa fyrir „loka íbúafundi“ en ekki var unnt að halda slíkan á árinu 2020. Norðurþing hefur tekið ákvörðun um að halda sambærilegu verkefni gangandi innan Öxarfjarðarhéraðs á nýju ári með ráðningu atvinnu-og samfélagsfulltrúa (til eins árs fyrst um sinn). Það er afar ánægjulegt í ljósi þess að talsvert af framfaraverkefnum eru í gangi sem mikilvægt er að styðja við og fylgja eftir.

Afar fjölbreytt sem og krefjandi verkefni hafa komið á borð verkefnisstjóra á liðnum árum og eru einnig framundan. Það stendur þó helst upp úr á verkefnistímanum hvað margir íbúar og fyrirtæki svæðisins eru að vinna mikið og gott frumkvöðla- og nýsköpunarstarf og það á mörgum sviðum. Erindum og fyrirspurnum frá verkefnisstjóra var alltaf vel tekið hvort sem leitað var til sveitarfélagsins, íbúa eða fyrirtækja. Þá hafa þessir sömu aðilar einnig lagt til talsverða vinnu í ýmis verkefni sem skipti miklu máli.

Hér að neðan í skjalinu má sjá lista yfir þau fjölmörgu verkefni sem Öxarfjörður í sókn hefur styrkt frá upphafi verkefnistímas, en ótal fleiri framfara- og uppbyggingar verkefni eru auðvitað í gangi á svæðinu og hafa verið styrkt af öðrum sjóðum. Það sýnir hvað samfélagið samanstendur af öflugu fólki og fyrirtækjum. Á svæðinu er talsverð uppbygging framundan, fiskeldi Samherja og fiskeldi Austfjarða eru að sækja fram með uppbyggingu á Kópaskeri, Kelduhverfi og Öxarfirði sem mun leiða af sér mikla vinnu fyrir verktaka, þjónustuaðila sem og að skapa störf til framtíðar og kallar einnig á uppbyggingu íbúðarhúsnæðis sem stefnt er að að fara í. Ágætis árangur náðist í vinnu að flestum starfsmarkmiðum á verkefnistímanum, sérstaklega þegar horft er til forgangsroðunar málaflokka á íbúðarþinginu, þó vissulega séu nokkrar undantekningar.

Verkefnisstjóri Öxarfjarðar í sókn

Charlotta England



Markmið og tilgangur verkefnisins Brotthættra byggða

Verkefnið Brothættar byggðir er ein af aðgerðum Byggðaááætlunar, en verkefnið Brothættar byggðir hefur verið á áætlun síðan 2014 og er sértækt verkfæri Byggðastofnunar til að aðstoða byggðarlög sem standa höllum fæti. Sótt er um aðild að verkefninu fyrir byggðarlög og ræðst fjöldi þátttökubyggðarlaga af efnum og aðstæðum á hverjum tíma. Aðgerðin fellur undir eitt af lykilsviðum byggðaááætlunar er snýr að sértækum aðgerðum á varnarsvæðum. Meginmarkmið verkefnisins er að stöðva viðvarandi fólksfækkun í smærri byggðakjörnum og í sveitum landsins. Verkefnið er ætlað viðkomandi byggðarlögum til að nýta sóknarfæri, einkum þau sem byggja á sérstöðu þeirra. Brothættar byggðir er sértæk aðgerð fyrir smærri byggðakjarna og sveitir landsins, sem á tíðum eru aðilar sem vegna smæðar sinnar hafa ekki getað nýtt sér önnur úrræði ríkis og sveitarfélaga til stuðnings byggðaþróunar- og samfélagsuppbyggingar. Með þessu samstarfi taka ríki, sveitarfélag, stoðkerfi og íbúar höndum saman um eflingu byggðarlagsins. Ekki er meiningin að búa til nýtt lag ofan á stoðkerfið, heldur vettvang þar sem leiddir eru saman kraftar og mynduð einskonar „sérsvait“. Sérstaða verkefnisins er fólgin í virkri þátttöku íbúa og víðtæku samstarfi stjórnkerfis og stoðstofnana við viðkomandi samfélag. Í hverju verkefni, það er hverri brothættri byggð, er mótuð skýr framtíðarsýn, markmið og verkefnastofn og unnið samkvæmt áfangaskiptu verklagi Brothættra byggða.

Stjórn verkefnisins, fundir og áfangar

Alls komu þrjár verkefnisstjórar að verkefninu:

Silja Jóhannesdóttir 2016-2017

Bryndís Sigurðardóttir 2018

Charlotta Englund 2018-2020

Nokkrar breytingar hafa orðið á samsetningu verkefnisstjórnarinnar.

2016-2018

Charlotta Englund, fulltrúi íbúa

Sigríður K. Þorgrímsdóttir, Byggðastofnun (form. 2016)

Kristján Þór Magnússon, Norðurþing (form. 2017-)

Kristján Þórhallur Halldórsson, Byggðastofnun

Pétur Þór Jónasson, Eyþing

Reinhard Reynisson, Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga

Stefán Haukur Grímsson, fulltrúi íbúa

2019-2020

Eva Pandora Baldursdóttir, Byggðastofnun

Kristján Þór Magnússon, Norðurþing (formaður)

Kristján Þórhallur Halldórsson, Byggðastofnun

Páll Björgvin Guðmundsson og Hilda Jana Gísladóttir, Eyþing

Reinhard Reynisson, Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga

Salbjörg Matthíasdóttir, fulltrúi íbúa

Stefán Haukur Grímsson, fulltrúi íbúa

2019-2020

Eva Pandora Baldursdóttir, Byggðastofnun

Helga Harðardóttir, Byggðastofnun

Kristján Þór Magnússon, Norðurþing (formaður)

Kristján Þórhallur Halldórsson, Byggðastofnun

Ari Páll Pálsson, SSNE

Baldvin Valdemarsson, SSNE

Salbjörg Matthíasdóttir, fulltrúi íbúa

Stefán Haukur Grímsson, fulltrúi íbúa



Undirbúningur, stefnumótun og áætlanagerð

Í lok árs 2015 kom stjórn verkefnisins saman til fyrsta fundar en á svipuðum tíma var einnig gengið frá ráðningu verkefnisstjóra. Í ársbyrjun 2016 var verkefninu ýtt úr vör með íbúabingi og í kjölfarið hófst greiningarvinna og áætlanagerð sem kynnt var fyrir íbúum á opnum fundi 27. apríl 2016. Þar gafst íbúum færi á að koma með athugasemdir. Í kjölfarið hafa verið haldnir íbúabundir árlega þar sem verkefnisáætlun verkefnisins hefur verið uppfærð og talsvert af markmiðum bæst við/eða tekið breytingum eftir aðstæðum.

Framkvæmd og lok verkefnisins

Verkefnisstjórn hélt alls 30 (snerti og fjarfundi) á verkefnistímanum. Alls voru haldnir fimm íbúafundir á vegum verkefnisins (íbúabingið 2016 þar með talið). Mætingin var að jafnaði góð og mikil þátttaka. Miðað við mætingu á síðasta íbúafundi sem haldinn var 2019 var ljóst að verkefnið væri að ná betri fótfestu og þá mættu íbúar af öllu svæðinu, alls um 50 aðilar að verkefnisstjórn meðtalinni.

Verkefnisstjórnin hefur staðið vel við bakið á verkefnisstjóra á verkefnistímanum og sinnt sínu hlutverki afar vel.

Verkefnið var hýst hjá *Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga* fyrstu fjögur árin. Í ársbyrjun 2020 var ákveðið að sameina *Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga*, *Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar* og *Eyþing* undir heitinu *Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra (SSNE)*.

Ekki tókst þó að halda fund 2020 vegna kórónuveirufaraldursins. Stefnt er að því að halda lokafund á árinu 2021.

Á verkefnistímanum hafa orðið til talsvert af "aukaverkefnum/tilfallandi verkefnum" sem verkefnistjóri hefur þurft að ganga í, flest þeirra má þó vissulega tengja við meginmarkmið verkefnisins að einhverju leyti.

Sveitarfélagið Norðurþing hefur ákveðið að ráða fráfarað verkefnisstjóra til starfa sem atvinnu- og samfélgsfulltrúa í Öxarfjarðarhéraði til þess að stuðla að áframhaldandi uppbyggingu ásamt því að fylgja þeim framfaraverkefnum eftir sem nú eru í gangi. Það gefur til kynna að litið sé svo á að verkefnið hafi skilað jákvæðum árangri.





Framtíðarsýn

Öxarfjarðarhérað er þekkt fyrir hágæða matvælaframleiðslu er byggir meðal annars á hugvitsamlegri og ábyrgri nýtingu á auðlindum héraðsins. Ferðaþjónusta er ört vaxandi atvinnugrein í héraði stórbrotinnar, fjölbreyttrar en viðkvæmrar náttúru. Hagsmunaaðilar í ferðaþjónustu hafa tekið höndum saman og skipulagt uppbyggingu með þarfir umhverfis og samfélags í huga, ekki síður en efnahagslegar þarfir. Uppbyggilegt og samheldið samfélag þar sem framfarir í atvinnulífi, ásamt öflugum innviðum, hafa leitt til jákvæðrar íbúáþróunar á verkefnistímanum.




Meginniðurstöður

Á íbúáþingi Öxarfjarðarhéraðs var forgangsröðun málaflokka eftirfarandi. Þar kemur skýrt fram að raforku - og fjarskiptamál, ásamt grunnstoðum/þjónustustigi sveitarfélagsins, fengu flest atkvæði. Hér að neðan verður fjallað stuttlega um hvað hefur verið gert í hverjum málaflokki fyrir sig á verkefnistímanum.

Raforka, ljósleiðari og útvarpsskilyrði

Búið að leggja ljósleiðara á svæðinu, þá er einnig búið að laga útvarpsskilyrðin að einhvefju leyti. Búið er að leggja talsvert af jarðstrengum á vegum Rarik sem mun bæta afhendingaröryggi raforku á svæðinu en vonir standa til að haldið verði áfram á þeirri braut. Lítið hefur gerst varðandi hringtenginu Landsnets sem myndi “fullkomna” afhendingaröryggi raforku á Norðaustuhorninu. Verkefnisstjóri hefur þó beitt sér í þessu máli og mun gera áfram á nýjum vettvangi.

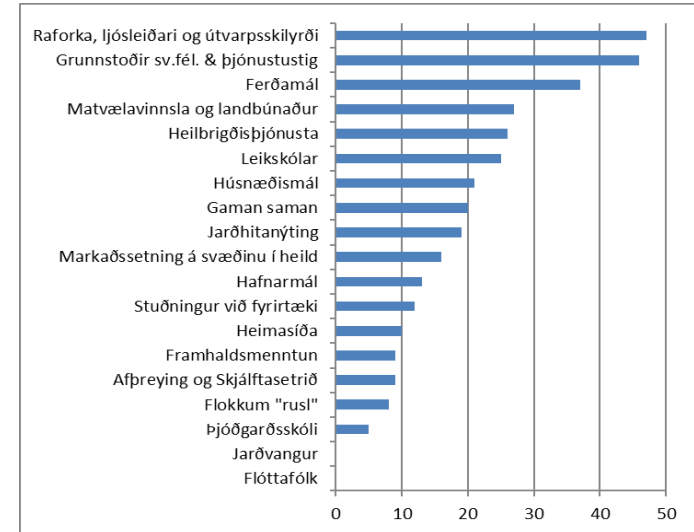

Heimild: ILDI, Öxarfjörður í sókn – Skilaboð íbúáþings, janúar 2016

Grunnstoðir sveitarfélagsins og þjónustustig

Þjónustustig sveitarfélagsins stendur nokkuð í stað og mun í besta falli gera á komandi ári í ljósi áhrifa Covid-19 og tilheyrandi niðurskurðar. Þó er búið að ráða inn tímabundið Atvinnu- og samfélagsfulltrúa sem er jákvætt. Þá hefur sveitarfélagið einnig bætt skrifstofuaðstöðuna í Öxi (stjórnsýsluhúsinu á Kópaskeri) sem leiðir það af sér að til urðu þó nokkur skrifstofurými fyrir t.d. störf án staðsetningar og starfsmenn sveitarfélagsins. Eins geta íbúar leitað til starfsmanns fjármála- og bókarasviðs NP(bókara), verkefnisstjóra Norðurhjara ferðaþjónustusamtaka, atvinnu- og samfélagsfulltrúa Öxarfjarðarhéraðs og sérfræðings á Þróunarsviði Byggðastofnunar.

Ferðamál

Lagningu nýs Dettifossvegar er svo gott sem lokið. Þó nokkur frumkvöðaverkefni eru í gangi og dæmi eru: áfangastaðaverkefni, fuglaskoðunarskýli hafa verið reist, verkefni um hótél og baðstað, veitingastað, gistihús og -hýsi svo eitthvað sé nefnt (ath ekki tæmandi listi).

Mætvælavinnsla og landbúnaður

Á verkefnistímanum kláraði Fjallalamb upprunamerkinguna og er nú hægt að rekja vörunar beint til bónda, tvær heimavinnslur hafa orðið til og hlotið styrki úr Öxarfirði í sókn, sem og Ullarvinnslan á Gilhaga. Enn fremur hefur verkefnið styrkt verkefni sem snúa að jarðarberja, rófu-og hvítlauksrækt á svæðinu.

Heilbrigðisþjónusta

Litlar breytingar hafa orðið á heilbrigðisþjónustu á svæðinu, hefur haldist að mestu leyti. Heilbrigðisþjónustan er góð og mjög mikilvægt að svo verði áfram.

Leikskólar

Á verkefnistímanum breyttust viðmið um fjölda barna í leikskólanum á Kópaskeri og þá hefur verkefnisstjóri reynt að stuðla að því að samlegð leikskólana verði eflað. Framundan eru skipulagsbreytingar sem gætu haft jákvæð áhrif.

Húsnæðismál

Afar erfitt getur reynst að kaupa/leigja húsnæði á svæðinu. Verkefnisstjóri vann samantekt um húsnæðismálin og í lok verkefnistímans hefur verið samþykkt í sveitarstjórn að skoða húsnæðismálin á svæðinu með það í huga að byggðar verði íbúðir. Viðræður við leigufélagið Bríet eru hafnar.

Gaman saman

Verkefnisstjóri hefur komið að skipulagningu sólstöðuhátíðarinnar á Kópaskeri undanfarin ár. Árið 2019 var hægt að halda mjög stóra hátíð og stefnt er að því að halda áfram á þeirri braut. Verkefnisstjóri reyndi einnig að hvetja íbúa af öllu svæðinu til þátttöku, með t.d. kynningu á fyrirtækjum á hátíðinni. Þá hefur verkefnisstjóri einnig lagt sig fram við að kynna alla þá menningarviðburði sem eru í boði á svæðinu ásamt því að koma að skipulagningu 1. des. hátíðar á Kópaskeri.

Jarðhitanyting

Öxarfjörður í sókn styrkti kælingarverkefni Hitaveitu Öxarfjarðar sem nýtir heita vatnið á svæðinu. Þá sótti verkefnisstjóri einnig um styrkt í C1 og Uppbyggingarsjóðinn fyrir for- og greiningarvinnu gróðurhúsa á svæðinu sem myndu nýta jarðhita. Þá hefur ÖÍS einnig styrkt verkefni um baðstað á svæðinu.

Markaðssetning á svæðinu í heild

Á sviði ferðamála hefur Norðurlandi markvisst kynnt svæðið sem áfangastað í um tíu ár. Þá hefur Markaðsstofa Norðurlands einnig staðið fyrir sínu. Búið er að taka fyrstu skref í að reyna að kynna matvælaframleiðslu svæðins í heild.

Hafnarmál

Búið að senda erindi til Skipulags- og framkvæmdaráðs og þegar stefnir í bættu nýtingu hafnarinnar verður viðhaldið meira.

Stuðningur við fyrirtæki

Verkefnið í heild hefur stutt talsvert við fyrirtæki og frumkvöðla á svæðinu. Alls hafa um 23 lögaðilar hlotið styrk úr ÖÍS, þá hefur verkefnisstjóri einnig aðstoðað fyrirtæki talsvert við umsóknargerð í aðra styrktarsjóði. Einnig hefur talsverð vinna farið í að styðja við fyrirtæki á örðum sviðum, gerð gæða- og öryggishandbókar, áætlanagerð, starfsmannamál o.fl.

Heimasíða

Er í þokkalegum gangi, þó eru fésbókarsíður svæðisins virkari og fá fleiri heimsóknir. Lágmarksuppfærslu/viðhaldi á heimasíðunni er ávallt sinnt.

Framhaldsmenntun

Ekkert gerst í þessu/á ekki við lengur.

Afþreying og Skjálftasetrið

Verkefnisstjóri hefur komið að þó nokkrum umsóknum fyrir Skjálftasetrið og einnig er vinna í fullum gangi sem snýr að því að nútímavæða sýninguna og reksturinn. Verkefnið hefur stutt við talsvert af öðrum verkefnum sem snúa að afþreyingu á svæðinu. Það eru þó nokkur verkefni tengd hestaferðum á svæðinu og útivist.

Flokkum “rusl”

Lágmarksflokkun komið á fyrir heimili á svæðinu.

Þjóðgarðsskóli

Ekkert gerst í þessu/á ekki við lengur.

Jarðvangur

Ekkert gerst í þessu/á ekki við lengur.

Flóttafólk

Ekkert gerst í þessu/á ekki við lengur.



Staða starfsmarkmiða ÖÍS

Hér verður gerð grein fyrir stöðu starfsmarkmiða ÖÍS í lok árs 2020.

1. Framandi áfangastaður						
Starfsmarkmið	0%	25%	50%	75%	100%	Skýringar
1.2 Að fyrir árslok 2020 séu hafnar framkvæmdir við uppbyggingu á fjögurra stjörnu hóteli. Ábyrgð: Frumkvöðlar, verkefnisstjórn og fjárfestar. BREYTT 2019						Frumkvöðlar á svæðinu hafa leitt vinnu sem snýr að uppbyggingu á fjögurra stjörnu hóteli um miðjan Öxarfjörð. Þó nokkrir styrkir hafa fengist í þetta verkefni á s.l. árum. Þó á eftir að fullfjármagna verkefnið, vinna í þeim málum stendur yfir þó vissulega sé smá lægð yfir þessu verkefni vegna Covid-19.
1.3 Að matvæli af svæðinu sé í boði á sem allra flestum veitingastöðum í Norðurþingi og nærliggjandi sveitarfélögum. Komið verði á virku samtali framleiðenda og rekstraraðila í veitingageiranum ásamt því að mælanlegum markmiðum á árangri í þeim efnum verði komið á fyrir árslok 2019. Ábyrgð: Fjallalamb, Rifós, Íslandsbleikja, Beint frá býli, garðyrkjubændur, veitingahúseigendur og verkefnisstjórn. BREYTT 2019						Verkefnisstjóri hefur í tvígang gert "atlögur" hvað þetta verkefni varðar. Áhugi til að byrja að ræða þessi mál frekar virðist í fljótu bragði ekki vera til staðar og erfitt hefur reynt fyrir minni aðila að fá veitingastaði utan héraðs til þess að taka sínar afurðir inn. Til þess að skapa einhverskonar sameiginlegan vettvang fyrir þessa aðila á svæðinu stofnaði verkefnisstjóri grúppu á facebook þar sem verður hægt að ræða þessi mál, deila fréttum, upplýsingum o. þ.h.Nanna verkefnisstjóri á Raufarhöfn hefur einnig aðgang að síðunni.
1.4 Að fyrir mitt ár 2017 skili hópur íbúa uppfærðum áherslum í ferðamálum fyrir svæðið sem mun sýntast inn í áframhaldandi stefnumótunarvinnu frá hinu opinbera og DMP planning verkefni. Ábyrgð: Verkefnastjóri og stjórn Framfarafélagsins. Samráð: AP, Ferðamálastofa, íbúasamtök og Norðurhjar.						Tókst vel, sjá skýrslu: https://www.northiceland.is/static/files/DMP/dmp_skyrsla_2018_2utgafa_web.pdf
1.5 Skjálftasetur sé komið með tryggn rekstrargrunn og 10. m.kr til uppbyggingar safnsins fyrir árslok 2020. Að sóttur verði meiri stuðningur við reksturinn t.d. gegnum ráðstefnur vísindamanna, m.a. með tengingu við skjálftaráðstefnuna á Húsavík. Ábyrgð: Skjálftafélag og verkefnisstjóri. BREYTT 2019						Sumarið 2019 var afar erfitt að fá rekstrarfé þó tókst fyrir rest að ná nokkrum styrkjum. Búið að halda opinn endurstefnumótunarfund, ráða verkefnisstjóra (Lovísu Óladóttur) og vinnan í fullum gangi. Þá er jafnframt búið að semja við hönnunarstofuna Gagarín til að sjá um endurhönnun. Verkefnisstjóri ÖÍS og Ari P. Pálsson (SSNE) hafa sinnt þessu verkefni talsvert. Allt á góðri leið, þarfnast eftirfylgni áfram.
1.6 Fyrir lok árs 2019 skili hópur íbúa uppfærðum áherslum til uppbyggingar ferðamannastaða tengdum fuglaskoðun innan svæðisins ásamt því að byggja upp fleiri fuglaskoðunarskýli. Markmiðið verði að gera svæðið út sem enn meira fuglaskoðunarsvæði en nú er gert. Unnið í samráði við Fuglastíg til þess m.a. að efla skipulag leiðsagnar í fuglaskoðun, kortlagningar fuglaskoðunarstaða og uppbyggingar þeirra. Tækifæri er til fuglaskoðunar á heimismælikvarða innan héraðsins árið um kring. Ábyrgð: Íbúar, Fuglastígur, Norðurhjar, landeigendur, verkefnisstjórn og verkefnisstjóri. BREYTT 2019						Endurstefnumótun hefur farið fram hjá Fuglastíg. Þá er búið að koma upp fuglaskoðunarskýli á Kópaskeri, og fjármagna selaskoðunarskýli sem á að risa við Bakkahlaup á næsta ári. Búið er að sækja um fjármagn til þess að bæta aðgengi að skýlinu á Kópaskeri.
1.7 Komið verði upp tveimur fleiri áfangastöðum ferðamanna fyrir árslok 2019. Skoða m.t.t.: Salernisaðstöðu, Stefnumarkandi áfangastaðaáætlun Norðurhjara (sérstaklega Fjallahöfn og Veggjarendi), Áfangastaður á flekaskilum tengt Skjálftasetrinu og Alfred Wagener. Ábyrgð: Skjálftasetur(stjórn), Norðurhjar, hagsmunaaðilar, verkefnisstjóri og frumkvöðlar. BREYTT 2019						Silja Jóhannesdóttir hefur fyrir hönd NP leitt vinnu sem snýr að uppbyggingu áfangastaða á svæðinu, sem taka m.a. mið af Áfangastaðaáætlun Norðurhjara, Áfangastaðaáætlun Markaðsstofu Norðurlands, greiningu verkefnastjóra Langanesbyggðar með verkefnum Fuglastíg og Norðurstrandarleið til hliðsjónar. Búið er að fara í hönnunarvinnu, kynna fyrir hagaðilum ásamt því að sækja um framkvæmdafé í Framkvæmdasjóð ferðamannastaða til að fjármagna alls um sjö verkefni austan Tjörnness; Naustárfoss, Snartarstaðir 2, Snartarstaðarnúp, Hvalvík/Hestfjall, aðgengi að fuglaskoðunarskýli, Höskuldarnes og Hólaheiði. Þá hefur Norðurhjar leitt for- og greiningarvinnu sem snýr að því að koma upp áfangastað við Veggjarendann/Misgengið í Kelduhverfi. Landslag sá um hönnun á stöðunum.

1. Framandi áfangastaður						
Starfsmarkmið	0%	25%	50%	75%	100%	Skýringar
1.8 Kortlagning á vatnsbólum-þar sem atvinnuuppbygging framtíðar byggð á vatnsauðlindinni verði skoðuð lokið 2020. Ábyrgð: Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga. BREYTT 2019						Á vef Orkustofnunar er til góð kortasjá þar sem má nálgast þessar upplýsingar t.d. Upplýsingar um borholur, grunnvatnshlot o.fl.
1.9 Bóð í Öxarfjarðarhéraði, fyrir lok árs 2019 liggja fyrir heildstæð viðskiptaáætlun og stefna um áframhaldandi vinnu. Ábyrgð: Áhugamannahópur um bóð, verkefnisstjóri verkefnisins samráð við landeigendur. BREYTT 2019						Viðskiptaáætlun liggur fyrir, stefnt er að því að taka aftur upp þráðinn næsta haust þá eru líkur til þess að aðstæður í samfélaginu séu betri.
1.10 Móta stefnu og aðgerðaráætlun um nýtingu, viðhald og umhirðu á eignum Norðurþings í Lundi fyrir árslok 2019. Ábyrgð: Norðurþing, verkefnisstjóri og rekstraraðilar. NÝTT 2019						<p>Sundlaugin Þörf á alsherjaryfirferð næsta fyrir næsta sumar. Laugin var mikið lokuð sumarið 2020 vegna þess að búnaður bilaði mikið. Málið er í ferli.</p> <p>Tjaldsvæðið/tjaldsvæðishús: Sveitarfélagið skilar landinu formlega af sér, íbúar á svæðinu stefna að því að reka það næsta sumar.</p> <p>Skóla- og leikskólalóð Í góðum farvegi.</p> <p>Gamli Lundur Smíða þarf veggstubb sem lokar af kjallarageymslu frá íbúðarrými. Stefnt að því að skoða það að sækja um í Húsafriðunarsjóðinn árið 2021.</p>
1.11 Að komið verði upp á Kópaskeri sýningunni „Heimildarlaus notkun bönnuð“ í annað sinn sumarið 2019. Ábyrgð: Verkefnisstjóri og listamaður. NÝTT 2019						Tókst vel til og það var einnig farið í hreinsunaráttak á ströndum svæðisins.
1.12 Koma þarf þvottaplani í gagnið í Ásbyrgi fyrir árslok 2019. Skýringar: Í dag er ekki bílapvottaplan virkt milli Húsavíkur og Kópaskers og er það mjög bagalegt fyrir þá fjölmörgu sem ferðast um Hólssand og veginn um þjóðgarðinn vestan Jökulsár (Dettifossvog). Ábyrgð: verkefnisstjórn, Norðurþing, Heilbrigðiseftirlit og eigandi/umsjónaraðili. NÝTT 2019						Búið að ræða þetta mál talsvert við landeigendur, það er ennþá skortur á ferskvatni í Ásbyrgi og því ekki forsundur til þess að skoða þetta nánar í bili. Mögulega minnkar þörfin eitthvað aðeins með tilkomu nýs DF vegar. Þá er gert ráð fyrir þvottaplani í skipulagi í landi Meiðavalla og því ekki ólíklegt að þar komi til með að vera þvottaplan þegar fram líða stundir.

2. Framsækni í matvælaframleiðslu						
Starfsmarkmið	0%	25%	50%	75%	100%	Skýringar
2.1 Fjallalamb klári verkefni með upprunamerkingu. Lok árs 2017. Ábyrgð: Fjallalamb og verkefnisstjóri.						Tókst vel.
2.2 Viðskiptaáætlun fyrir stækkun Akursels. Lok árs 2018. Ábyrgð: Akursel og verkefnisstjóri.						Aflagt.
2.3 Kanna hvort nýta megi verkefnið „Heimaslóð“ til að auka verðmætasköpun sauðfjárbænda í héraðinu. Ábyrgð: Verkefnisstjóri Heimaslóðar, verkefnisstjóri og bændur(Salbjörg Matthíasdóttir. BREYTT 2019						Þetta verkefni er ekki í gangi lengur og ekki komið framhaldsverkefni (nema eitthvað sé í gangi sem verkefnisstjóri veit ekki af). Vert að nefna í þessu samhengi að verkefnið ÖÍS hefur styrkt heimavinnsluverkefni á svæðinu talsvert en þá fékkst einnig 5 m.kr. styrkur úr Öndvegissjóð í kjötvinnsluna í Árdal (auka framlög til atvinnusköpunar frá ríkinu).
*2.4 Fjallalamb treysti eiginfjárstöðu fyrir lok árs 2016. Ábyrgð: Fjallalamb í samstarfi við eigendur.						Tókst vel.
2.5 Þróðar verði og markaðssettar tvær vörur úr hliðarafurðum sauðfjárlátrunar fyrir lok árs 2019. Ábyrgð: Fjallalamb í samstarfi við AP, (Matís), verkefnisstjóra og aðra hagsmunaaðila. BREYTT 2019.						Eins og er þá er það aðeins miltað sem fellur til og er ekki notað yfir höfuð, en líklega er langsótt að fá leyfi til þess að nota miltað. Þó staðan sé sú að lítið sem engu er hent, þá mætti auðvitað verðmætasköpun vera meiri. Aðeins var kannað hvort Fjallalamb gæti unnið afurðir úr beinum, en það verður ekki skoðað frekar að svo stöddu.
2.6 Styðja við Grólinð (langtímaverkefni í umsjón Landgræðslunnar) m.t.t. þess að tryggja hóflega beit á svæðinu annars vegar og hins vegar hagnýtingu upplýsinga í markaðslegu tilliti. Ábyrgð: (Landgræðslan) Fjallalamb, Búnaðarfélag/bændur og (verkefnisstjóri fylgist með framvindu). BREYTT 2019						Verkefnisstjóri er á póstlista og er þetta í góðum farvegi. Í júní 2020 voru kynntar niðurstöður GróLindar á annars vegar stöðumati á ástandi á landi og hins vegar kortlagning beitalanda sauðfjár. Gögnin eru opin öllum í kortasjá á www.grolind.is
*2.7 Stækkun Silfurstjörnu fyrir lok árs 2017. Ábyrgð: Silfurstjarnan.						Tókst vel og er stefnt að því að stækka enn frekar 2021.

2. Framsækni í matvælaframleiðslu						
Starfsmarkmið	0%	25%	50%	75%	100%	Skýringar
2.8 Gera úttekt á því hverju nýir landbúnaðarsamningar breyta á þessu svæði og hvaða tækifæri kunna að felast í þeim. Sérstaklega kannað m.t.t. kolefnisjöfnunar. Fyrir lok sumars 2019. Ábyrgð: Hagsmunaaðilar(Baldur Stefánsson) (og verkefnisstjóri). BREYTT 2019						Þegar þetta markmið var sett á blað stóð til að beingreiðslur til bænda yrðu teknar út, ekki varð úr því.
2.9 Leggja meiri áherslu á skógrækt og fá stjórnvöld í lið með heimamönnum. Fyrir lok 2019. Ábyrgð: Bændasamtökin á svæðinu og verkefnastjóri. BREYTT 2019						Skógrækt á Lögbýlum - 17 jarðir með samning, - Samtals 935 hektarar - Meðalsamningurinn er 55 hektarar - Það er búið að gróðursetja í 551 hektara . Verkefnisstjóri fór í kynningarátak, ekki ljóst hvort það hafi skilað einhverju að svo stöddu.
2.10 Stuðla að og styðja við verkefni sem snúa að grænmetis, -ávaxta- og berjaræktun á Sandinum sérstaklega m.t.t nýtingar jarðhita. Ábyrgð: Verkefnisstjóri, Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, frumkvöðlar og Eimur. NÝTT 2019						Búið að kanna eitt og annað í þessu máli, t.d. Hvort væri í boði fyrir áhugasama aðila að leiga Akursel, ekki í boði þá. Á Skinnastað var sumarið 2020 ræktaður hvítlaukur í tilraunaskyni, í sendnum jarðvegi, aðstandendur stefna að því að rækta meira 2021. Verkefnisstjóri sendi inn umsókn í C1 og Uppbyggingarsjóðinn til þess að fjármagna verkefnisstjóra í að kanna grunnforsendur fyrir gróðurhúsum á sandinum í Öxarfirði, jákvæðar niðurstöður úr C1 og búið að ráða verkefnisstjóra.
2.11 Kolefnisjöfnun sauðfjárramleiðslu og úrvinnslu í héraðinu. Fara í stöðumat/greiningu þegar reiknireglur og forsendur liggja fyrir að loknum greiningum á vegum RML. Svæðið reyni að vera leiðandi á landsvísi í þessu átaki. Ábyrgð: Landgræðslan(Sigríður Þorvaldsdóttir), RML, Fjallalamb, Búnaðarfélag og áhugasamir bændur/hagsmunaaðilar (verkefnisstjóri fylgist með framvindu). NÝTT 2019						Í vinnslu hjá RML.
2.12 Kanna hver staða Kelduhverfis sé sem „hreins sauðfjárræktarsvæðis“ með tilliti til fullrar þátttöku í kolefnisjöfnuninni fyrir mitt ár 2019. Ábyrgð: Fjallalamb. NÝTT 2019.						Svæðið er opið/hreint að því leytnu til að lömb verða leyfð á sláturhúsinu á Kópaskeri og fullgild sem "hrein" á Kínamarkaði. Slátrun fullorðins fjár er óheimil en til endurskoðunar skv. upplýsingum frá MAST (20.10.2020).
2.13 Kanna hvort mögulegt sé að dreifa gor á lokuð svæði til landgræðslu fyrir árslok 2020. Ábyrgð: Fjallalamb og Landgræðslan (Sigríður Þorvaldsdóttir) og (verkefnisstjóri fylgist með framvindu). NÝTT 2019						Í vinnslu. Strandar fyrst og fremst á smá útfærsluatriði í bili.
2.14 Skilgreina og útfæra jarðhitanýtingarverkefni. Taka saman yfirlit um þau verkefni, rannsóknir og greiningar sem eru til. Ábyrgð: Verkefnisstjóri, Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, frumkvöðlar og Eimur. NÝTT 2019						Samantektin er til hjá verkefnisstjóra ÖIS, verkefnisstjóri sendi umsókn í Uppbyggingarsjóðinn fyrir forvinnu að gróðurhúsum sem munu vonandi nýta jarðhitann.
2.15 Kanna möguleika fyrir kynningu á matvælaframleiðslu í héraðinu. Fyrir árslok 2019. Ábyrgð: verkefnisstjóri og hagsmunaaðilar. NÝTT 2019						Komin fésbókarsíða sem ætlað er að verði samstarfs/samráðsvettvangur matvælafyrirtækja á svæðinu.

3. Uppbyggilegt samfélag						
Starfsmarkmið	0%	25%	50%	75%	100%	Skýringar
3.1 Kynna hlutverk hverfisráða svæðisins og Framfarafélags Öxarfjarðar í samfélaginu fyrir mitt ár 2019. Mikilvægt að viðhalda hverfisráðunum og að þau séu virk, og að Framfarafélagið sé áfram kynnt sem „hýsill/bakland“ fyrir m. a. frumkvöðla og viðburði á svæðinu öllu. Ábyrgð: Norðurþing, verkefnisstjóri, hverfisráðin og Framfarafélag. BREYTT 2019						Eru kynnt á heimasíðu svæðisins, hverfisráðin eru dugleg að halda íbúafundi. Framfarafélagið hýsir ýmsa viðburði, þorablót, sólstöðuhátíð, baðverkefni og sennilega kemur annað verkefni inn á næstunni.
3.2 Kynning á verkefninu Öxarfjörður í sókn í öllum ráðum og nefndum Norðurþings og meðal starfsmanna sveitarfélagsins fari reglulega fram og ekki sjaldnar en árlega. Ábyrgð: Norðurþing í samstarfi við verkefnisstjórn og verkefnisstjóra. BREYTT 2019						Búið að kynna talsvert 2019 og 2020, þá var einnig kynning á verkefninu innan stjórnar SSNE.
3.3 Halda áfram að efla og byggja upp heimasíðu svæðisins og uppfæra reglulega fyrir lok árs 2019. Ábyrgð: Heimasíðuhópur sem búið er að stofna, verkefnisstjóri og Norðurþing. BREYTT 2019						Nýjar fréttir/auglýsingar/tilkynningar settar inn reglulega. Verkefnisstjóri reynir að setja alltaf inn það sem fer á fésbókina þar líka.
3.4 Fylgja eftir að Norðurþing horfi til verktaka á svæðinu, m.t.t. heimaaðila. Sveitarfélagið rökstyðji það ef ákveðið er að skipta við þjónustuaðila utan Öxarfjarðarhéraðs. Ábyrgð: Norðurþing í samstarfi við verktaka. BREYTT 2019						Var tekið fyrir á sveitarstjórnarfundi, 19. febrúar 2019 ákveðið var að gera þetta eins og hægt er. Mikilvægt að fylgjast með áfram að þetta sé áfram haft að leiðarljósi.
3.5 Þrýsta á stjórnvöld að jafna kjör verslana á landsbyggðinni með lækkun VSK til verslana í dreifbýli. Skoða m.t.t. til markmiðs 3.6. Ábyrgð: Verslunarrekendur í samstarfi við verkefnisstjóra. NÝTT 2019						Það má tengja þau framfaraverkefni sem hafa átt sér stað hjá Skerjakollu og Ásbyrgi hefur sótt um styrk til þess að fara í viðhald (fengu styrk úr A9).
3.6 Skilgreina sýn íbúa á lágmarks þjónustubætti í héraðinu og gildi Kópaskers sem þjónustukjarna ásamt því að ráða um gildi verslunar í heimahéraði. Ábyrgð: t.d. Þekkingarnet Þingeyinga í samstarfi við AP, Byggðastofnun, verkefnisstjóra, hverfisráðin og aðra hagsmunaaðila. BREYTT 2019						Búið að gera könnun í samstarfi við ÞP. Verður rætt/kynnt betur á íbúafundi,
3.7 Halda fyrirtækjadag á Sólstöðuhátíð á Kópaskeri aftur 2019. Ábyrgð: Verkefnisstjóri í samstarfi við Framfarafélag Öxarfjarðar, sólstöðuhátíðarnefnd og aðra hagsmunaaðila. BREYTT 2019						Gekk afar vel á árinu 2019, í ljósi aðstæðna 2020 var ákveðið að halda ekki fyrirtækjadag, verður skoðað í kringum 1. des í staðinn.
3.8 Hvetja og styðja við fyrirtæki til að ráða frekar starfsfólk sem er reiðubúið til búsetu á svæðinu. Ábyrgð: Byggðaráð, verkefnisstjórn, verkefnisstjóri og sveitarstjóri. BREYTT 2019						Eftir að hafa haft samband við stærstu fyrirtækin á svæðinu kom í ljós að flestir reyna að gera þetta, eins og hægt er. Fiskeldi Samherja t.d. hafa lagt upp úr því að ráða þör eins kostur er á.
3.9 Gera kunnáttukönnun á meðal nýbúa og könnun á þeirra þörfum. Fyrir lok árs 2019. Ábyrgð: verkefnisstjóri, Norðurþing, Þekkingarnet Þingeyinga, Framfarafélagið og Rauði krossinn. BREYTT 2019						Lenti á milli ábyrgðaraðila. Verkefnisstjóri ætlar að reyna að fá fjölmenningsfulltrúa NP til þetta að skoða þetta mál.
3.10 Sameining félaga til að efla félagastarfsemi fyrir árslok 2019. Ábyrgð: Stjórnir félaganna. NÝTT 2019						Til umræðu og afgreiðslu í stjórnun ungmennafélaganna. Stefnir að því að kynna þetta betur fyrir íbúum.

4. Öflugir innviðir						
Starfsmarkmið	0%	25%	50%	75%	100%	Skýringar
4.1 Auka samstarf og samlegð leikskólanna fyrir árslok 2019. Ábyrgð: Norðurþing. BREYTT 2019						Árið 2020 hefur einkennst af óvissu í tengslum við covid-19 sem hefur vissulega haft áhrif á ýmis áform. Þá stendur einnig til að sameina allt undir eina stjórn sem mun kalla á nýtt skipulag. Þá er mikilvægt að samráð verði haft við foreldra í ferlinu. Stjórnendur leikskóladeildanna munu í vetur hittast reglulega og bera saman bækur sínar.
4.2 Komið sé á háhraða netsamband skv. áætlun ríkisstjórnar fyrir lok árs 2019. Ábyrgð: Ríkið í samstarfi við Norðurþing og netveitendur á svæðinu. Verkefnisstjórn fylgi málinu eftir hjá ríkinu. BREYTT 2019.						Komið.
4.3 Fjölga íbúðum á leigumarkaði fyrir lok árs 2019. Skýringar: mögulega þarf að stofna leigufélag. Tryggja leiguhúsnæði á markaði með því að byggja og reyna að koma íbúðarhúsum í Kelduhverfi í leigu (ríkið skilyrði búsetu). Tengist húsnæðisáætlun Norðurþings og þátttöku sveitarfélagsins í tilraunaverkefni á vegum Íbúðalánasjóðs. Ábyrgð: Verkefnisstjóri í samvinnu við opinbera aðila. BREYTT 2019						Verkefnisstjóri vann samantekt árið 2018, búið að hafa samband við forsvarsmenn helstu fyrirtækja á svæðinu varðandi að ræða þetta mál, viðræður við leigufélagið Bríet eru komnar vel af stað.
4.4 Tryggja áframhaldandi starfsemi í óskertri heilbrigðisþjónustu ótímabundið. Ábyrgð: Verkefnisstjórn í samstarfi við Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN), (Lyfju), Pósturinn og Norðurþing. BREYTT 2019						Nokkuð stöðugt eins og er og mikilvægt að svo verði áfram. Samgönguverkefnið gæti haft áhrif hér einnig. (Framundan er einnig að skoða Stóru-Mörk og reksturinn þar, fyrst og fremst kanna hvort forsendur séu fyrir því að vera með mötuneyti samhliða).
4.5 Tryggja afhendingaröryggi raforku með því að skilgreina hringtengingu til austurs frá Kópaskeri til Vopnafjarðar sem hluta flutningskerfis raforku. Áætlun Landsnets liggja fyrir í lok verkefnistímans. Ábyrgð: Sveitarfélög, AP, (Landsnet) og verkefnisstjóri. BREYTT 2019						Búin að senda formlega fyrirspurn til Landsnets, ekki á dagskrá á næstunni, Landsnet og Rarik benda hvort á annað í grófum dráttum. Meira verður gert í þessu máli 2021.
4.6 Úttekt á húsnæðismálum í héraðinu lokið á árinu 2018. Ábyrgð: Norðurþing í samstarfi við AP og verkefnisstjóra, auk annarra hagsmunaaðila.						Verkefnisstjóri vann skýrslu/samantekt og mun koma að uppfærslu húsnæðisáætlunar fyrir Öxarfjararðhérað.
4.7 Langtímaáætlun Norðurþings um viðhald hafnar á Kópaskeri m.t.t. dýpkunar og lýsingar hafnarinnar, viðgerðar á göngubru á o.fl. fyrir árslok 2019. Ábyrgð: Norðurþing. BREYTT 2019						Sendi erindi í ágúst https://www.nordurthing.is/is/stjornsysla/skjol-og-utgefif-efni/fundargerdir/skipulags-og-framkvaemdarad/1297 Erfitt getur reynst að gera langtímaáætlun er varðar dýpkun þar sem ómögulegt er að segja til um hvenær þörf verður á að dýpka næst. Hinsvegar er það stefna Skipulags- og framkvæmdaráðs að viðhald hafnar sé í lagi og komist til móts við notendur þar. Breyttar forsendur eru framundan með tilkomu seiðaeldisins á Röndinni.

4. Öflugir innviðir						
Starfsmarkmið	0%	25%	50%	75%	100%	Skýringar
4.9 Unnið að því að bæta flokkunarmöguleika aukaafurða (sorps) íbúa Öxarfjarðarhéraðs fyrir árslok 2019. Ábyrgð: Norðurþing í samstarfi við umsjónaraðila. BREYTT 2019						Litlar breytingar í farvatninu frá því sem komið var á á verkefnistímanum, nema þá helst að það er í drögum að umhverfisstefnu sveitarfélagsins að kanna möguleika á moltugerð fyrir íbúa, stefnan er til umræðu hjá ráðum sveitarfélagsins núna. Eins og er eru tvær tunnur á lögbýlum annarsvegar fyrir pappír/pappa og hins vegar umbúðarplast sem og heimilismálma. Gámaplönin eru áfram og ekki sérstaklega boðið upp á flokkun fyrir fyrirtæki.
4.10 Póstdreifing á Kópaskeri og í dreifbýli verði færð til fyrra horfs og verði daglega fyrir lok árs 2019 (a.m.k. kröfur um staðfestu). Ábyrgð: Verkefnisstjórn í samstarfi við íbúasamtök, verkefnisstjóra, Norðurþing og Samband sveitarfélaga, auk annarra hagsmunaaðila. BREYTT 2019						Samgönguverkefnið gæti haft jákvæð áhrif á þetta markmið.
4.11 Úrbótaáætlun stjórnvalda/RÚV varðandi útsendingar útværps og sjónvarps í héraðinu fyrir mitt ár 2019. Fylgjast með að úrbætur séu framkvæmdar skv. áætlun. Ábyrgð: Verkefnisstjórn í samstarfi við hagsmunaaðila. BREYTT 2019						Á að vera komið í lag, þangað til annað kemur í ljós.
4.12 Sveitarafmagnslínur verði lagðar í jörð og fylgst með að áætlun Rarik haldi sér. Kanna sérstaklega m.t.t. þriggja fasa rafmagns Silfurstjarnan-Ásbyrgi. Ábyrgð: (RARIK), verkefnisstjórn fylgir eftir. BREYTT 2019						Breyttar forsendur í ljósi óveðursins í vetur. Búið að leggja 21 km á í jörð á Tjörnesi og 18 km í jörð á Melrakkasléttu 2020. Lagning strengs Silfurstjarna-Ásbyrgi er á áætlun 2022 þegar þetta er ritað.
4.13 Gerð verði áætlun um Hitaveitu í Kelduverfi fyrir lok árs 2019. Ábyrgð: Orkuveita Húsavíkur. BREYTT 2019						Sjá fundargerð 184. Fundur 23. nóvember 2018 kl. 08:30 - 10:47 í stjórnarsýsluhúsi Norðurþings. Verður ekki gert á næstunni nema stórnotandi komi inn.
4.14 Tryggja afhendingaröryggi lyfja. Bætt samstarf Póstsins og Lyfju og/eða skoða aðrar flutningsleiðir. Ábyrgð: HSN, verkefnisstjóri, verkefnisstjórn og Norðurþing. NÝTT 2019						Samgönguverkefni er í gangi sem gengur út á að flytja vörur og farþega. Mun óneitanlega stuðla að því að tryggja afhendingaröryggi lyfja ásamt því að auðvelda íbúum að sækja heilbrigðisþjónustu.
4.15 Tryggja aðgengi að ferskvatni í uppsveitum Kelduverfis fyrir lok árs 2020. Ábyrgð: Norðurþing, verkefnisstjórn og íbúar. NÝTT 2019						Vinnst hægt, er fyrst og fremst á ábyrgð landeigenda. Búið er að fara í smá forvinnu og mjög grófa kostanaáætlun fyrir að leiða vatni frá t.d. Sigtúnum og vestur yfir Jökuslá.
4.16 Kanna möguleika á lagningu annarra innviða með ljósleiðara (ferskvatn, hitaveita og þriggja fasa rafmagn) í Kelduverfi fyrir mitt ár 2019. Ábyrgð: Norðurþing, verkefnisstjórn og verkefnisstjóri. NÝTT 2019						Markmiðið kom of seint inn.
4.17 Tryggja viðhald malarvega t.d. á heimreiðum, þörf fyrir áætlun um viðhald malarvega í héraðinu. Fyrir árslok 2020. Ábyrgð: Norðurþing, Vegagerðin og verkefnisstjórn. NÝTT 2019						Þetta markmið komst lítið áfram.

Staða styrktra verkefna

2016

Heiti	Styrkþegi	Upphæð	Staðan des 2020
Fuglamerki og aflestur	Guðmundur Ö. Benediktsson	300.000	Lokið
Kjötvinnslan á Gilsbakka	Hafsteinn Hjálmarsson	1.000.000	Lokið
Leit og hönnun lausnar við að kæla vatn úr Æ3	Hitaveita Öxarfjarðar	1.000.000	Lokið
Örnefni í Öxarfirði	Urðarbrunnur menningarfélag	1.900.000	Lokið
Þróun mýkri ull	Framfarafélag Öxarfjarðar	2.800.000	Lokið

2017

Heiti	Styrkþegi	Upphæð	Staðan des 2020
Jarðarberjaræktun	Linda Björk Nielsdóttir	970.000	Lokið
Melar	Hildur Óladóttir	1.970.000	Lokið
Merkingar við Skjálftavatn	Norðurhjari	250.000	Lokið
Skref í átt til uppbyggingar náttúrubaða	Framfarafélag Öxarfjarðar	1.810.000	Lokið
Skerjakolla kaffihús	Skerjakolla ehf	1.500.000	Lokið
Melar	Hildur Óladóttir	1.000.000	Lokið
Kjötvinnslan á Gilsbakka	Hafsteinn Hjálmarsson	1.000.000	Lokið
Jarðarberjarækt	Linda Björk Nielsdóttir	500.000	Ólokið

2018

Heiti	Styrkþegi	Upphæð	Staðan des 2020
Sólstöðuhátíð á Kópaskeri	<i>Framfarafélag Öxarfjarðar</i>	200.000	Lokið
Norðurhjarikynnisferð	<i>Norðurhjariferðþjónustusa mtök</i>	600.000	Lokið
Áfangastaðþing	<i>Norðurhjariferðþjónustusa mtök</i>	350.000	Lokið
Melar-bakkaböð	<i>Hildur Óladóttir</i>	1.500.000	Lokið
Kantarellurækt	<i>Guðmundur Ö. Benediktsson</i>	200.000	Lokið
Hótel Sandfell	<i>K. Anna M. Englund</i>	2.000.000	Lokið
Aflestur fuglamerkja	<i>Guðmundur Ö. Benediktsson</i>	400.000	Lokið
Þróun lengri hestaferða	<i>Active North ehf</i>	1.250.000	Lokið
Nýting villtra jurta	<i>Kristín S. Gunnarsdóttir</i>	500.000	Lokið

2019

Heiti	Styrkþegi	Upphæð	Staðan des 2020
Kynnum nýjan Dettifossveg	<i>Norðurhjar</i>	400.000	Lokið
Ullarvinnsla á Gilhaga	<i>Mosabotnar ehf</i>	850.000	Lokið
Misgengisgönguhressing	<i>Skjálftafélagið</i>	150.000	Ólokið
Garður guesthouse	<i>Kristinn Rúnar Tryggvason</i>	600.000	Lokið
Deiliskipulag jarðar Meiðavalla við Ásbyrgi	<i>Ágústa Ágústsdóttir</i>	650.000	Ólokið
Þróun miðnætur hestaferða	<i>Bjarnastaðir hestaferðir ehf</i>	375.000	Lokið
Scubadiving in Öxarfjörður	<i>Neil Robertson</i>	300.000	Lokið
Kjötvinnslan í Árdal	<i>Salbjörg Matthíasdóttir</i>	1.000.000	Lokið
Rófurækt á Presthólum	<i>Klapparós ehf</i>	675.000	Lokið

2020

Heiti	Styrkþegi	Upphæð	Staðan des 2020
Ræktun á Austursandi	Active North ehf	1.000.000	Lokið
Rófurækt á Presthólum	Klapparós ehf	2.000.000	Lokið
Hestatengd ferðapjónusta á Meðlavöllum	Heimahagar ehf	1.250.000	Lokið
Sólstöðuhátíð á Kópaskeri 2020	Framfarafélag Öxarfjarðar	900.000	Lokið
Gamla verkstæðishúsið á Kópaskeri	Sel sf.	1.000.000	Ólokið
Mórúni- jurталитun og handverk	Lón 2 ehf	500.000	Ólokið
Framtíð í fjárhúsi í Kelduverfi	Sigrún B. Víkingur	1.950.000	Ólokið
Bakkaböðin	Hildur Óladóttir	970.000	Ólokið
Kjöttvinnslan í Árdal	Salbjörg Mattíasdóttir	1.950.000	Ólokið
Áframhaldandi uppbygging á Bjarnastöðum	Bjarnastaðir hestaferðir ehf	1.250.000	Lokið
Tækifæri við Vegginn í Kelduverfi?	Norðurhjari	450.000	Lokið
Sparifé-þyslur og beikon	Hafsteinn Hjálmarsson	350.000	Ólokið

Alls voru 43 verkefni styrkt á verkefnistímanum.

Alls úthlutað 41.570.000 kr.

Alls voru 23 styrkjum úthlutað til félaga/samtaka, 12 til kvenna og 8 til karla.

KK	KVK	Félag/samtök
3.800.000	14.960.000	22.810.000

** Vert er að taka fram að eitt af þeim verkefnum sem hlaut styrk úr Öndvegissjóði í sérstöku fjárfestingarátaki rískisins vegna Covid-19 var Kjöttvinnslan í Árdal.



Styrkþegar(eða fulltrúar) árið 2020.
